


除染後放射線量マップ【酒井根西小学校】

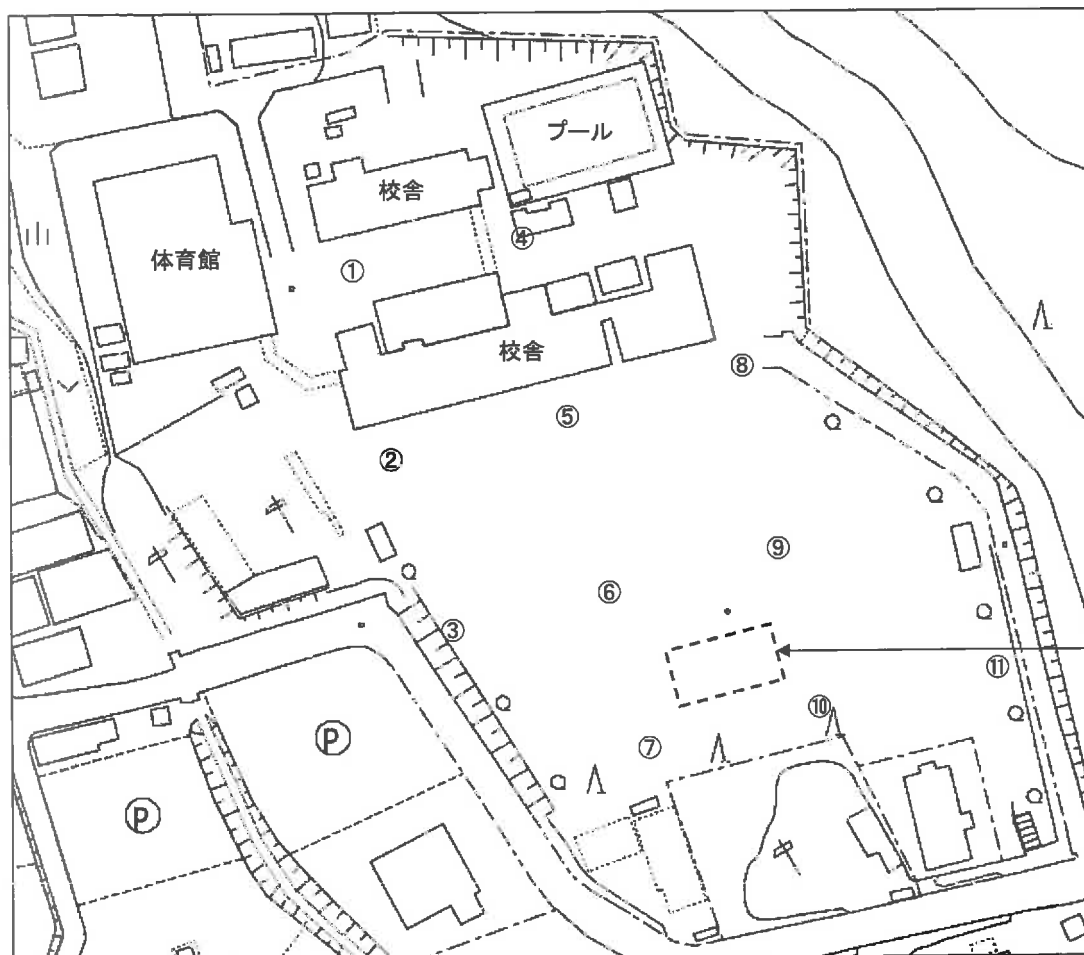

除去土壌
埋設箇所

○除染前測定日:平成24年6月28日

○除染後測定日:平成24年8月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.252	0.132	0.314	0.127	0.410	0.134
②	グラウンド	土	0.158	0.086	0.103	0.084	0.097	0.070
③	グラウンド	土	0.147	0.094	0.153	0.074	0.139	0.096
④	校舎裏	土	0.209	0.102	0.245	0.102	0.296	0.153
⑤	グラウンド	土	0.174	0.068	0.209	0.101	0.156	0.102
⑥	グラウンド	土	0.171	0.059	0.200	0.088	0.217	0.072
⑦	グラウンド	土	0.160	0.064	0.151	0.065	0.131	0.060
⑧	グラウンド	舗装	0.124	0.080	0.105	0.087	0.083	0.088
⑨	グラウンド	土	0.193	0.061	0.201	0.071	0.228	0.076
⑩	グラウンド	土	0.190	0.070	0.173	0.056	0.133	0.063
⑪	グラウンド	土	0.238	0.112	0.237	0.142	0.232	0.133
平均			0.183	0.084	0.190	0.091	0.193	0.095

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
