


除染後放射線量マップ【花野井小学校】

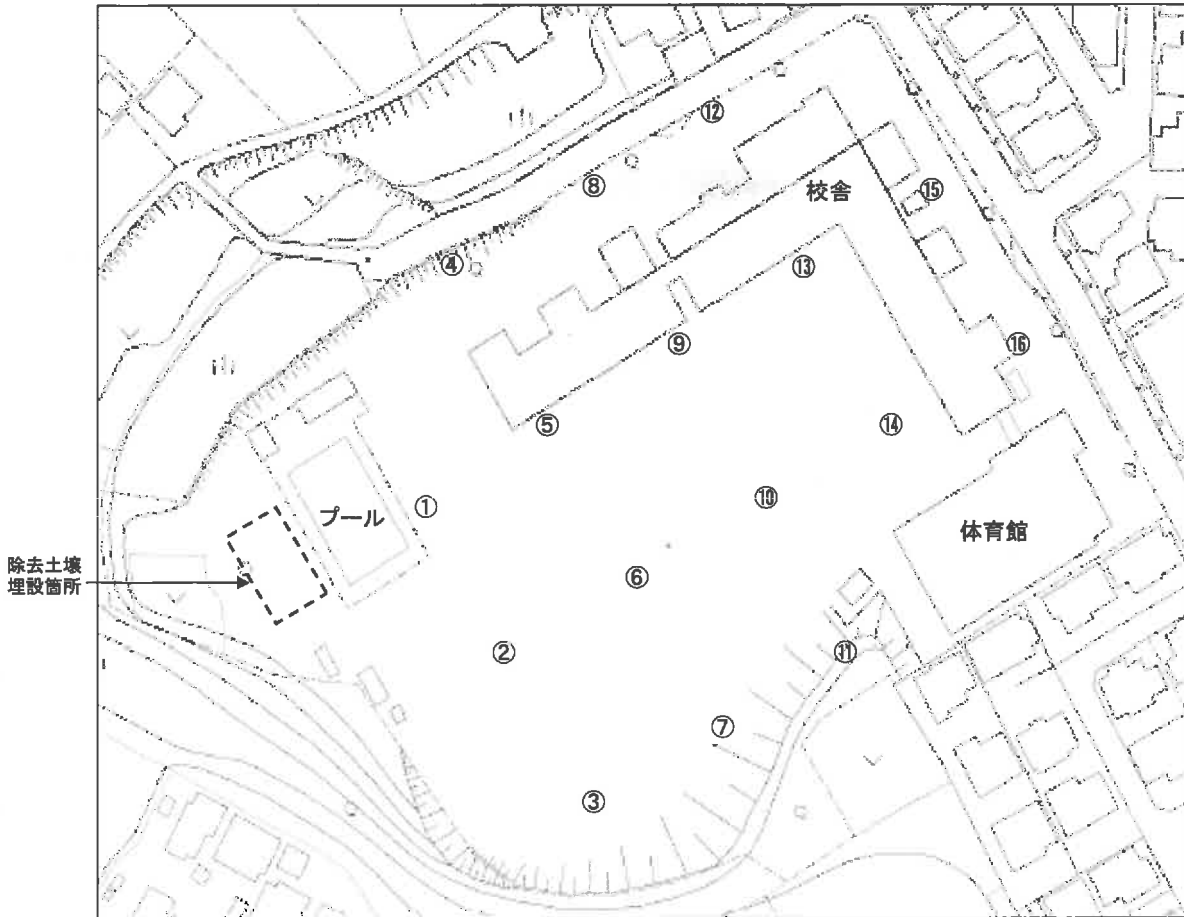

○除染前測定日:平成24年3月1日

○除染後測定日:平成24年5月14日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1:環境省基準				※2:柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	プール前	土	0.289	0.123	0.314	0.138	0.298	0.136
②	グラウンド	土	0.267	0.068	0.298	0.098	0.325	0.084
③	グラウンド	土	0.260	0.094	0.303	0.101	0.347	0.096
④	校舎裏	土	0.184	0.108	0.194	0.154	0.209	0.158
⑤	校舎前	土	0.255	0.135	0.307	0.154	0.321	0.217
⑥	グラウンド	土	0.276	0.077	0.303	0.081	0.288	0.095
⑦	グラウンド	土	0.268	0.130	0.298	0.124	0.287	0.119
⑧	校舎裏	アスファルト	0.169	0.207	0.154	0.220	0.182	0.195
⑨	校舎前	土	0.192	0.097	0.163	0.112	0.188	0.106
⑩	グラウンド	土	0.294	0.073	0.281	0.069	0.323	0.061
⑪	グラウンド	土	0.216	0.089	0.250	0.083	0.426	0.073
⑫	校舎裏	アスファルト	0.174	0.138	0.180	0.147	0.253	0.178
⑬	校舎前	土	0.292	0.122	0.239	0.119	0.301	0.116
⑭	グラウンド	土	0.275	0.105	0.248	0.083	0.349	0.064
⑮	校舎裏	アスファルト	0.170	0.162	0.167	0.182	0.199	0.166
⑯	校舎裏	アスファルト	0.214	0.137	0.206	0.166	0.202	0.165
平均			0.237	0.117	0.244	0.127	0.281	0.127

※1:環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2:柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
