


除染後放射線量マップ【柏中学校】

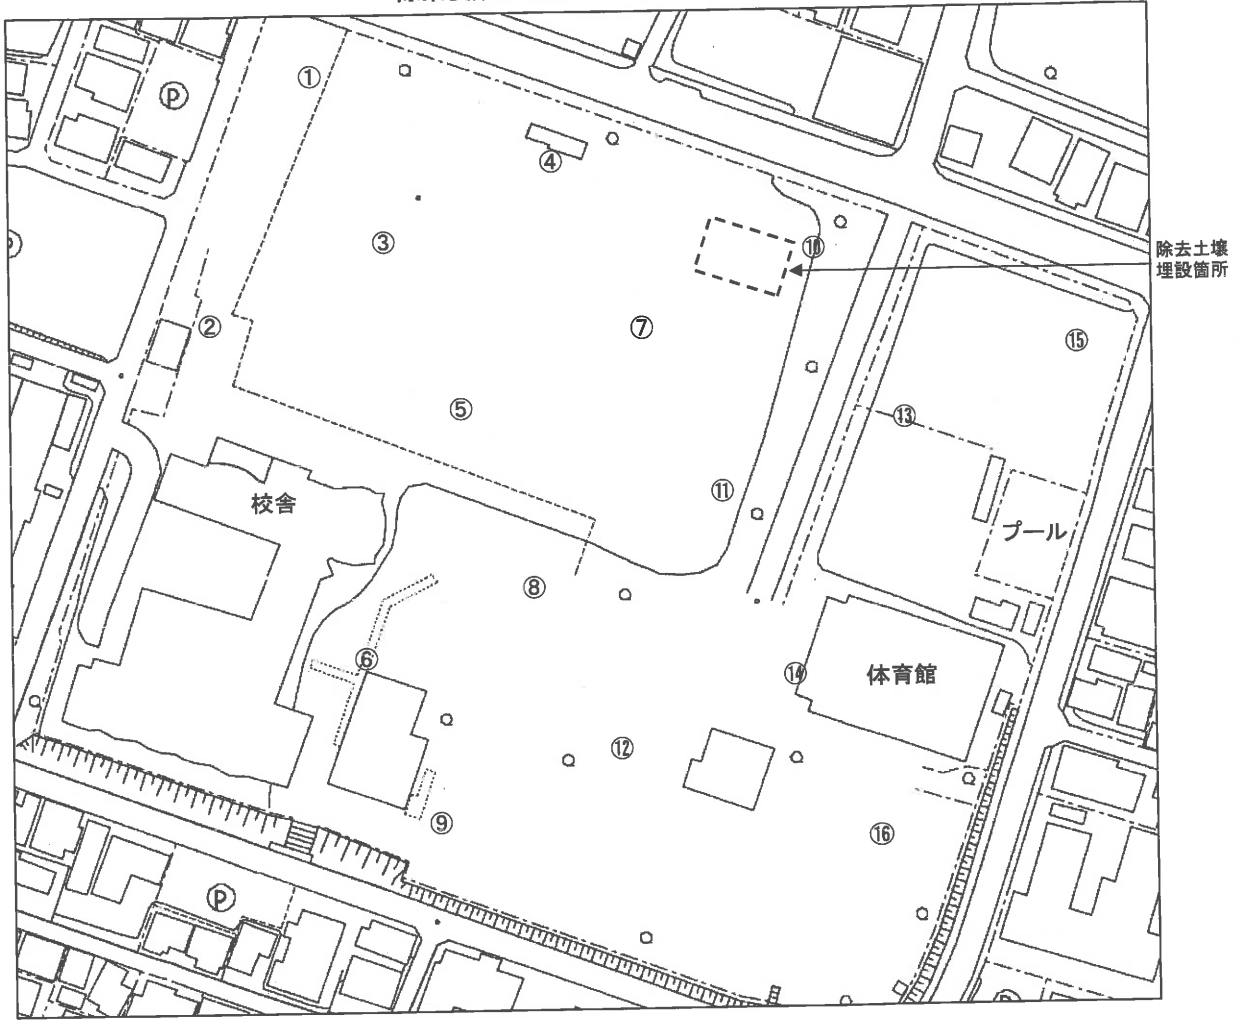

○除染前測定日:平成24年10月10日

○除染後測定日:平成24年11月30日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.209	0.149	0.222	0.166	0.353	0.207
②	グラウンド	土	0.122	0.093	0.123	0.088	0.119	0.109
③	グラウンド	土	0.162	0.092	0.171	0.113	0.139	0.103
④	グラウンド	土	0.174	0.110	0.173	0.112	0.150	0.103
⑤	グラウンド	土	0.141	0.096	0.124	0.089	0.124	0.090
⑥	校舎前	土	0.250	0.150	0.256	0.148	0.264	0.168
⑦	グラウンド	土	0.187	0.072	0.169	0.076	0.201	0.087
⑧	通路	舗装	0.171	0.119	0.185	0.115	0.199	0.125
⑨	グラウンド	土	0.358	0.108	0.356	0.104	0.356	0.074
⑩	グラウンド	土	0.205	0.108	0.208	0.117	0.191	0.096
⑪	グラウンド	土	0.223	0.132	0.223	0.128	0.245	0.131
⑫	グラウンド	土	0.191	0.086	0.185	0.084	0.160	0.073
⑬	バレーコート	土	0.107	0.067	0.119	0.062	0.113	0.075
⑭	体育館前	土	0.251	0.205	0.303	0.219	0.585	0.370
⑮	テニスコート	土	0.087	0.066	0.079	0.062	0.063	0.058
⑯	グラウンド	土	0.203	0.058	0.233	0.055	0.278	0.040
平均			0.190	0.107	0.196	0.109	0.221	0.119

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
