
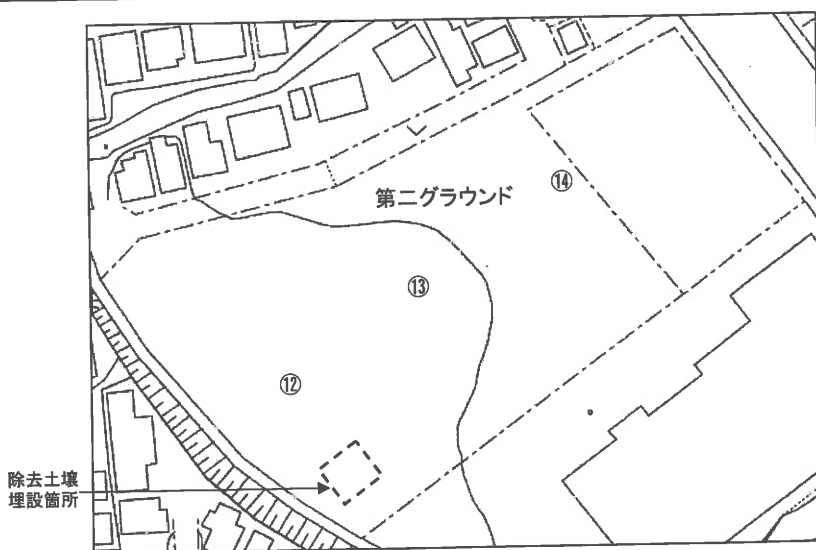


除染後放射線量マップ【柏第二中学校】

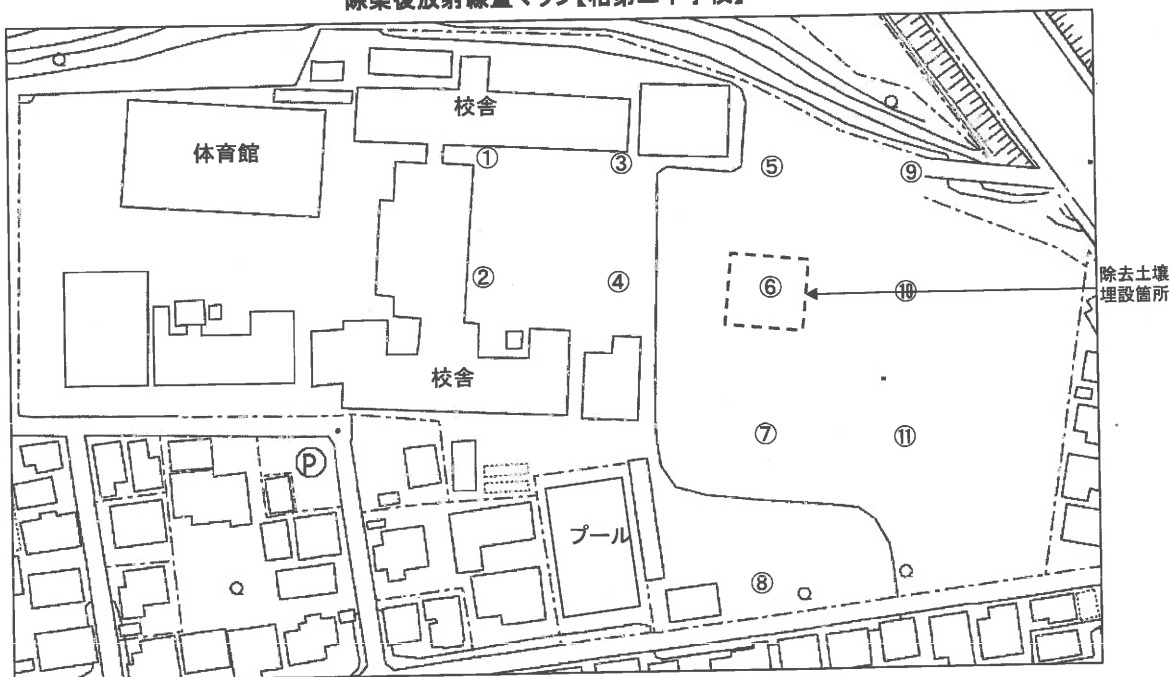

○除染前測定日:平成25年1月18日

○除染後測定日:平成24年11月13日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標		5cm	
			100cm		50cm		除染前	除染後
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	舗装	0.092	0.064	0.081	0.065	0.075	0.063
②	校舎前	土	0.145	0.084	0.160	0.090	0.233	0.097
③	校舎前	土	0.071	0.077	0.075	0.063	0.123	0.066
④	校舎前	土	0.100	0.042	0.089	0.042	0.100	0.047
⑤	グラウンド	土	0.103	0.086	0.097	0.098	0.068	0.088
⑥	グラウンド	土	0.100	0.110	0.096	0.092	0.113	0.084
⑦	グラウンド	土	0.088	0.105	0.085	0.096	0.114	0.073
⑧	グラウンド	土	0.185	0.075	0.150	0.092	0.127	0.073
⑨	グラウンド	土	0.130	0.096	0.118	0.102	0.123	0.095
⑩	グラウンド	土	0.196	0.104	0.193	0.110	0.182	0.105
⑪	グラウンド	土	0.122	0.106	0.133	0.115	0.136	0.083
⑫	グラウンド	土	0.254	0.151	0.256	0.149	0.240	0.130
⑬	グラウンド	土	0.171	0.113	0.162	0.115	0.168	0.117
⑭	グラウンド	土	0.213	0.109	0.206	0.098	0.257	0.101
平均			0.141	0.094	0.136	0.095	0.147	0.087

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
