


除染後放射線量マップ【富勢中学校】

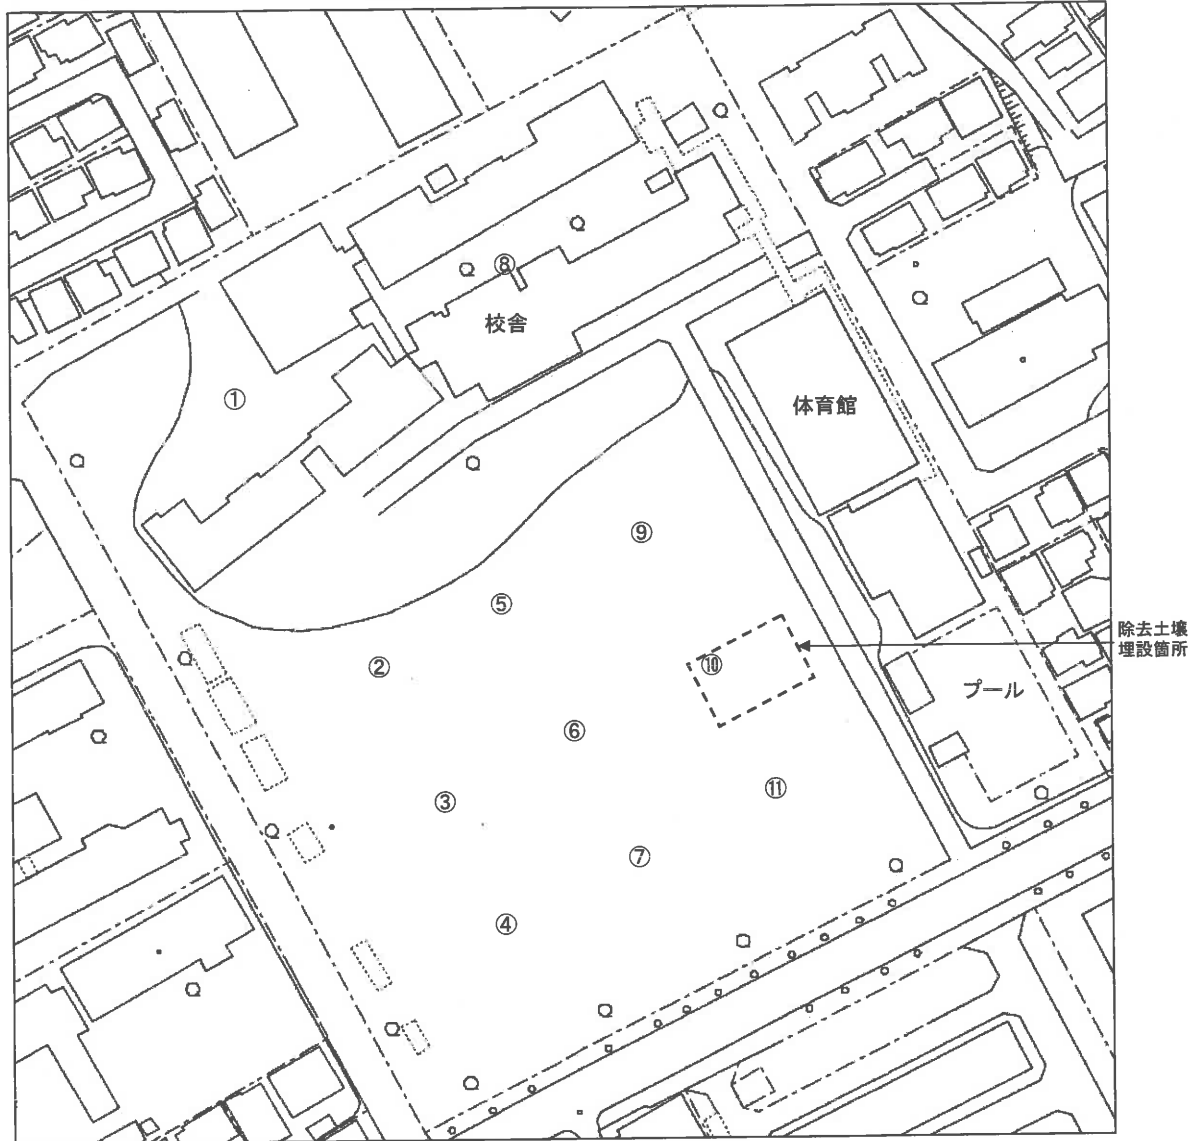

○除染前測定日：平成24年11月9日

○除染後測定日：平成24年12月19日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	テニスコート	土	0.119	0.078	0.135	0.083	0.167	0.060
②	グラウンド	土	0.189	0.096	0.170	0.090	0.159	0.104
③	グラウンド	土	0.138	0.074	0.180	0.106	0.149	0.089
④	グラウンド	土	0.144	0.090	0.150	0.098	0.130	0.094
⑤	グラウンド	土	0.162	0.093	0.157	0.098	0.163	0.108
⑥	グラウンド	土	0.139	0.085	0.171	0.097	0.159	0.103
⑦	グラウンド	土	0.161	0.091	0.173	0.099	0.171	0.096
⑧	校舎裏	舗装	0.146	0.091	0.147	0.067	0.119	0.069
⑨	グラウンド	土	0.213	0.096	0.254	0.102	0.303	0.104
⑩	グラウンド	土	0.142	0.098	0.155	0.089	0.173	0.116
⑪	グラウンド	土	0.157	0.108	0.162	0.113	0.145	0.100
平均			0.155	0.091	0.169	0.095	0.167	0.095

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
