


除染後放射線量マップ【南部中学校】

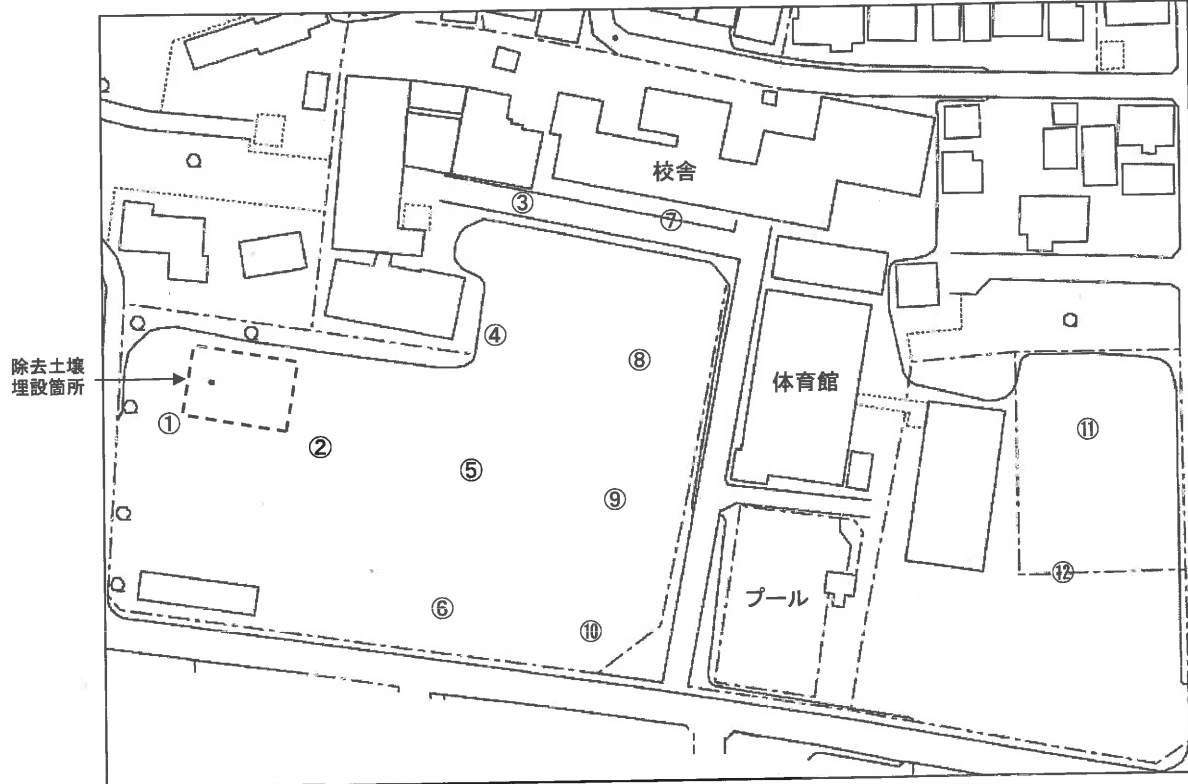

○除染前測定日:平成24年11月16日

○除染後測定日:平成25年1月10日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.134	0.092	0.132	0.105	0.154	0.102
②	グラウンド	土	0.107	0.080	0.101	0.108	0.103	0.101
③	校舎前	舗装	0.090	0.086	0.085	0.105	0.095	0.113
④	グラウンド	土	0.117	0.070	0.119	0.089	0.120	0.094
⑤	グラウンド	土	0.126	0.085	0.125	0.105	0.162	0.098
⑥	グラウンド	土	0.168	0.111	0.156	0.146	0.190	0.153
⑦	校舎前	舗装	0.085	0.080	0.093	0.074	0.076	0.095
⑧	グラウンド	土	0.115	0.083	0.132	0.104	0.102	0.097
⑨	グラウンド	土	0.160	0.091	0.170	0.121	0.168	0.116
⑩	グラウンド	土	0.140	0.075	0.128	0.110	0.159	0.116
⑪	テニスコート	土	0.129	0.060	0.116	0.068	0.099	0.061
⑫	テニスコート	土	0.112	0.062	0.124	0.060	0.122	0.051
平均			0.124	0.081	0.123	0.100	0.129	0.100

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
