


除染後放射線量マップ【酒井根中学校】

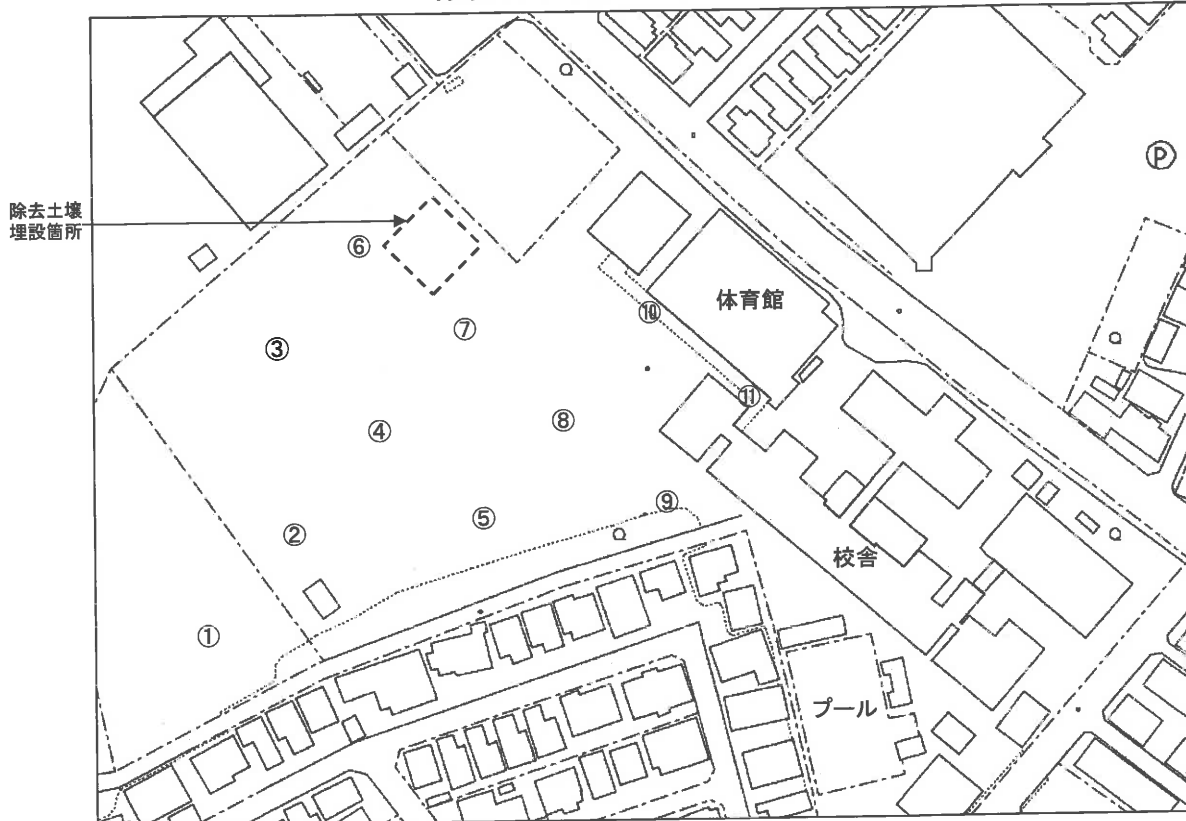

○除染前測定日:平成24年11月8日

○除染後測定日:平成25年1月9日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	グラウンド	土	0.126	0.102	0.106	0.089	0.121	0.075
②	グラウンド	土	0.135	0.095	0.141	0.106	0.294	0.102
③	グラウンド	土	0.163	0.080	0.138	0.100	0.149	0.100
④	グラウンド	土	0.119	0.095	0.146	0.104	0.139	0.158
⑤	グラウンド	土	0.139	0.073	0.141	0.103	0.140	0.095
⑥	グラウンド	土	0.091	0.077	0.095	0.123	0.163	0.096
⑦	グラウンド	土	0.166	0.093	0.198	0.077	0.174	0.084
⑧	グラウンド	土	0.141	0.104	0.157	0.109	0.114	0.170
⑨	グラウンド	土	0.095	0.078	0.105	0.089	0.100	0.098
⑩	体育館前	土	0.118	0.066	0.119	0.075	0.225	0.069
⑪	体育館前	舗装	0.103	0.079	0.117	0.074	0.109	0.082
平均			0.127	0.086	0.133	0.095	0.157	0.103

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
