


除染後放射線量マップ【逆井中学校】

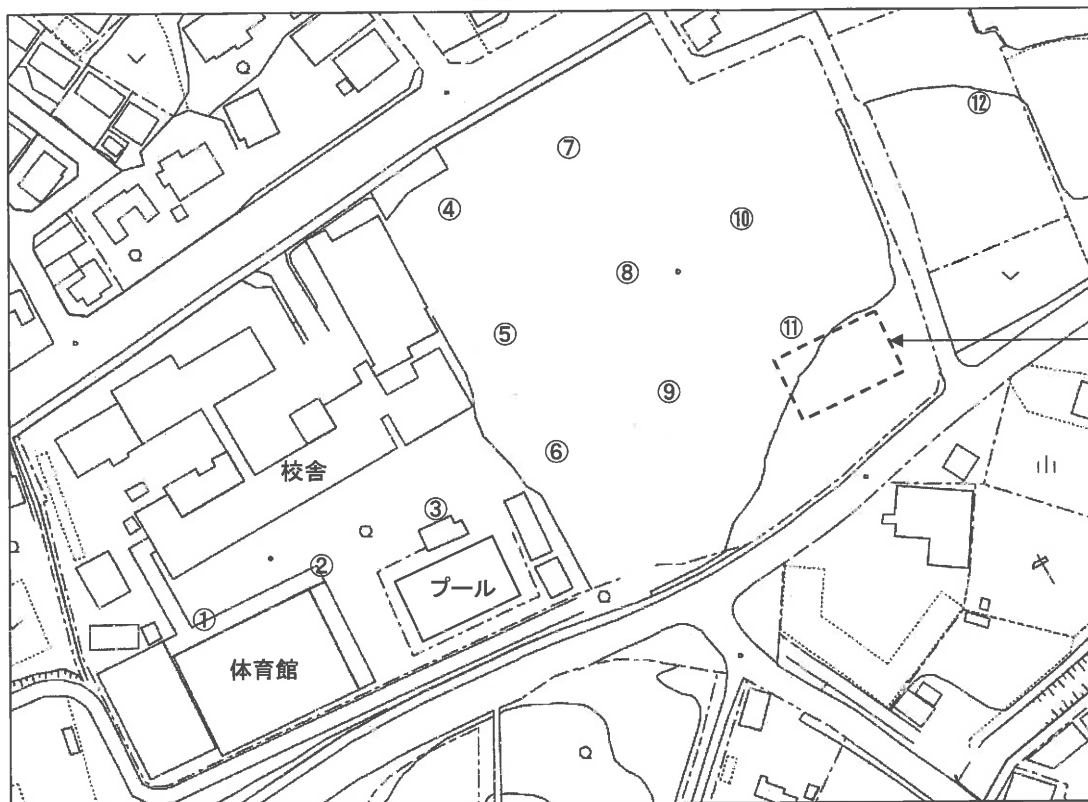

除去土壌
埋設箇所

○除染前測定日:平成24年11月16日

○除染後測定日:平成25年1月17日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	体育館前	土	0.151	0.106	0.148	0.104	0.181	0.090
②	体育館前	舗装	0.132	0.109	0.145	0.127	0.163	0.103
③	プール前	土	0.179	0.075	0.174	0.086	0.173	0.074
④	グラウンド	土	0.105	0.080	0.103	0.095	0.107	0.081
⑤	グラウンド	土	0.110	0.080	0.111	0.114	0.114	0.082
⑥	グラウンド	土	0.132	0.099	0.106	0.098	0.140	0.094
⑦	グラウンド	土	0.123	0.079	0.126	0.085	0.132	0.085
⑧	グラウンド	土	0.111	0.085	0.124	0.086	0.121	0.092
⑨	グラウンド	土	0.104	0.078	0.089	0.112	0.109	0.083
⑩	グラウンド	土	0.104	0.079	0.112	0.080	0.111	0.072
⑪	グラウンド	土	0.153	0.073	0.138	0.088	0.125	0.081
⑫	テニスコート	土	0.194	0.068	0.245	0.060	0.318	0.052
平均			0.133	0.084	0.135	0.095	0.150	0.082

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
