


除染後放射線量マップ【風早中学校】

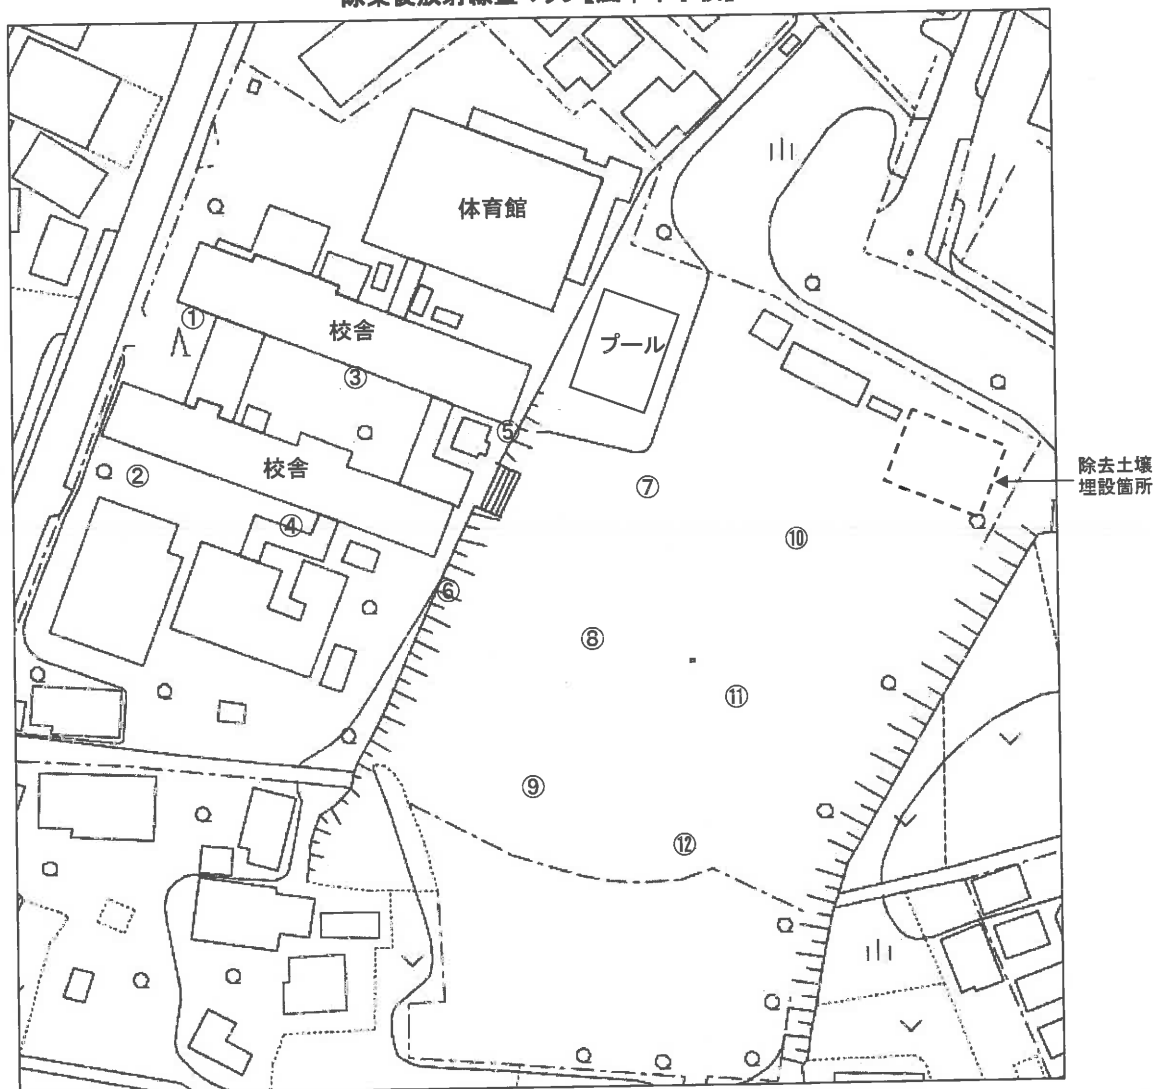

○除染前測定日:平成24年10月10日

○除染後測定日:平成24年11月29日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎前	土	0.144	0.120	0.152	0.136	0.176	0.169
②	校舎前	土	0.172	0.104	0.184	0.113	0.164	0.112
③	校舎前	土	0.159	0.100	0.189	0.119	0.318	0.104
④	校舎前	土	0.160	0.067	0.200	0.098	0.248	0.093
⑤	校舎横	土	0.208	0.133	0.279	0.162	0.421	0.162
⑥	校舎横	舗装	0.173	0.150	0.189	0.165	0.276	0.211
⑦	グラウンド	土	0.220	0.068	0.271	0.073	0.341	0.067
⑧	グラウンド	土	0.160	0.084	0.184	0.096	0.187	0.087
⑨	グラウンド	土	0.176	0.109	0.171	0.111	0.182	0.108
⑩	グラウンド	土	0.142	0.115	0.162	0.099	0.172	0.114
⑪	グラウンド	土	0.189	0.104	0.215	0.112	0.222	0.097
⑫	グラウンド	土	0.240	0.098	0.230	0.151	0.221	0.133
平均			0.179	0.104	0.202	0.120	0.244	0.121

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
