


除染後放射線量マップ【大津ヶ丘中学校】

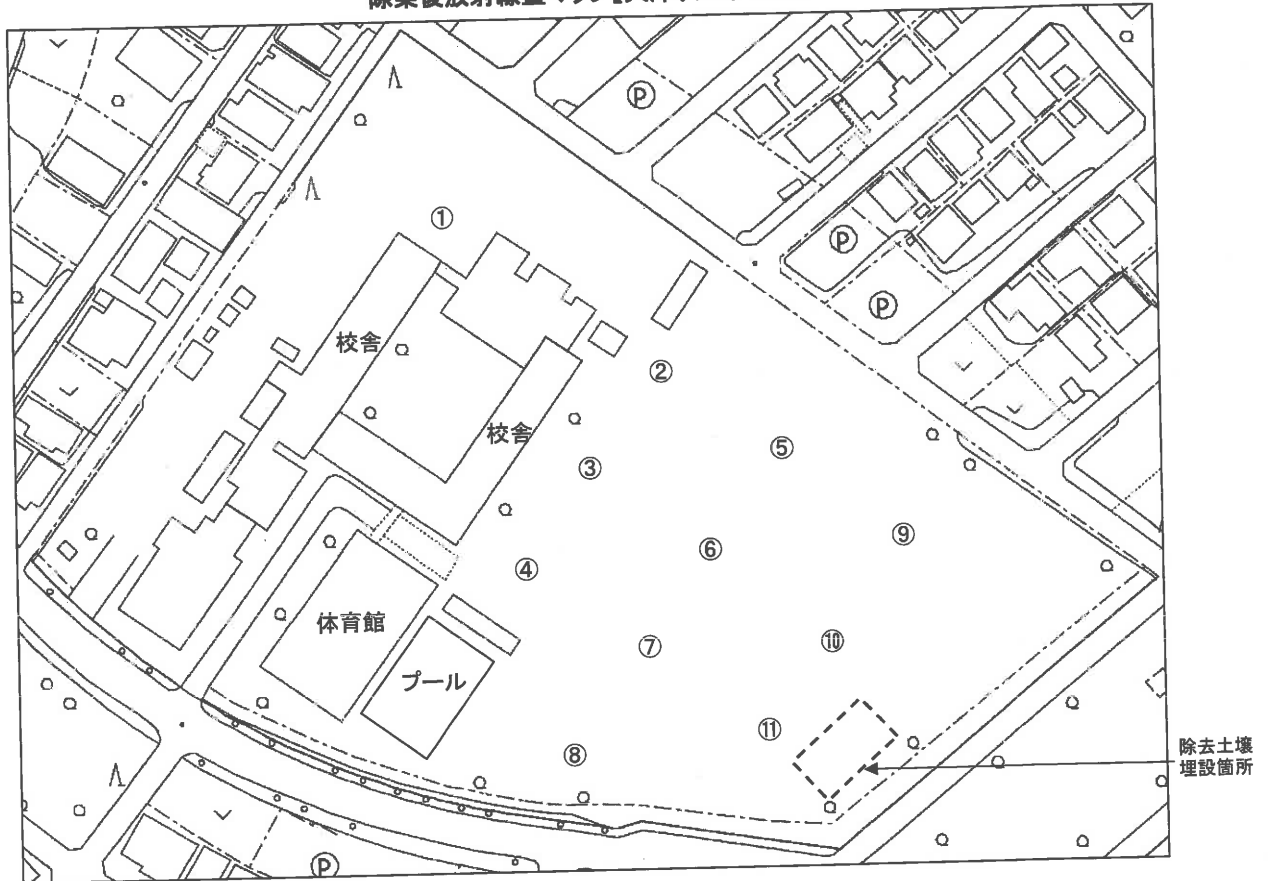

○除染前測定日：平成24年11月9日
○除染後測定日：平成25年1月10日

(単位：マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	校舎裏	土	0.196	0.122	0.217	0.128	0.224	0.098
②	グラウンド	土	0.173	0.107	0.168	0.110	0.180	0.079
③	グラウンド	土	0.174	0.100	0.180	0.095	0.174	0.075
④	グラウンド	土	0.190	0.118	0.178	0.136	0.155	0.168
⑤	グラウンド	土	0.211	0.081	0.203	0.091	0.199	0.079
⑥	グラウンド	土	0.128	0.064	0.156	0.063	0.142	0.074
⑦	グラウンド	土	0.184	0.070	0.192	0.085	0.168	0.075
⑧	グラウンド	土	0.318	0.098	0.299	0.104	0.287	0.092
⑨	グラウンド	土	0.170	0.075	0.181	0.092	0.152	0.090
⑩	グラウンド	土	0.149	0.094	0.163	0.089	0.163	0.094
⑪	グラウンド	土	0.146	0.086	0.150	0.092	0.141	0.091
平均			0.185	0.092	0.190	0.099	0.180	0.092

※1 環境省基準：地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
※2 柏市目標：地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
