


除染後放射線量マップ【高柳中学校】

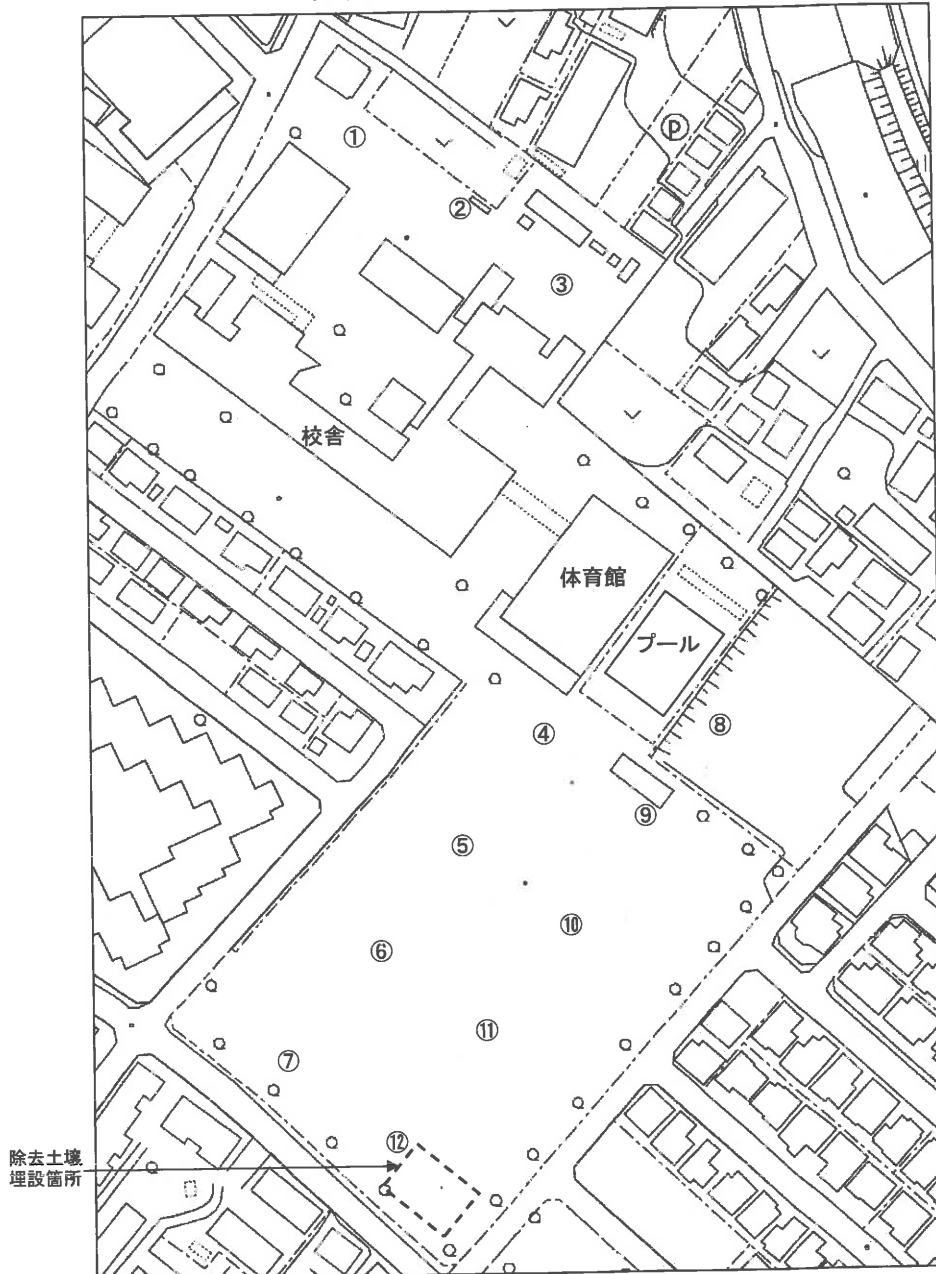

○除染前測定日:平成24年11月6日

○除染後測定日:平成25年1月17日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	通路	舗装	0.086	0.091	0.102	0.096	0.093	0.101
②	通路	舗装	0.103	0.080	0.129	0.087	0.129	0.083
③	通路	舗装	0.104	0.084	0.116	0.086	0.097	0.099
④	グラウンド	土	0.081	0.072	0.081	0.051	0.083	0.067
⑤	グラウンド	土	0.095	0.062	0.118	0.059	0.121	0.057
⑥	グラウンド	土	0.122	0.067	0.133	0.057	0.150	0.061
⑦	グラウンド	土	0.124	0.060	0.126	0.061	0.140	0.067
⑧	グラウンド	土	0.135	0.079	0.126	0.088	0.103	0.083
⑨	グラウンド	土	0.108	0.071	0.114	0.049	0.116	0.077
⑩	グラウンド	土	0.125	0.082	0.141	0.059	0.142	0.073
⑪	グラウンド	土	0.122	0.060	0.117	0.051	0.133	0.069
⑫	グラウンド	土	0.130	0.057	0.152	0.042	0.157	0.059
平均			0.111	0.072	0.121	0.066	0.122	0.075

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満
