


除染後放射線量マップ【市立柏高等学校】

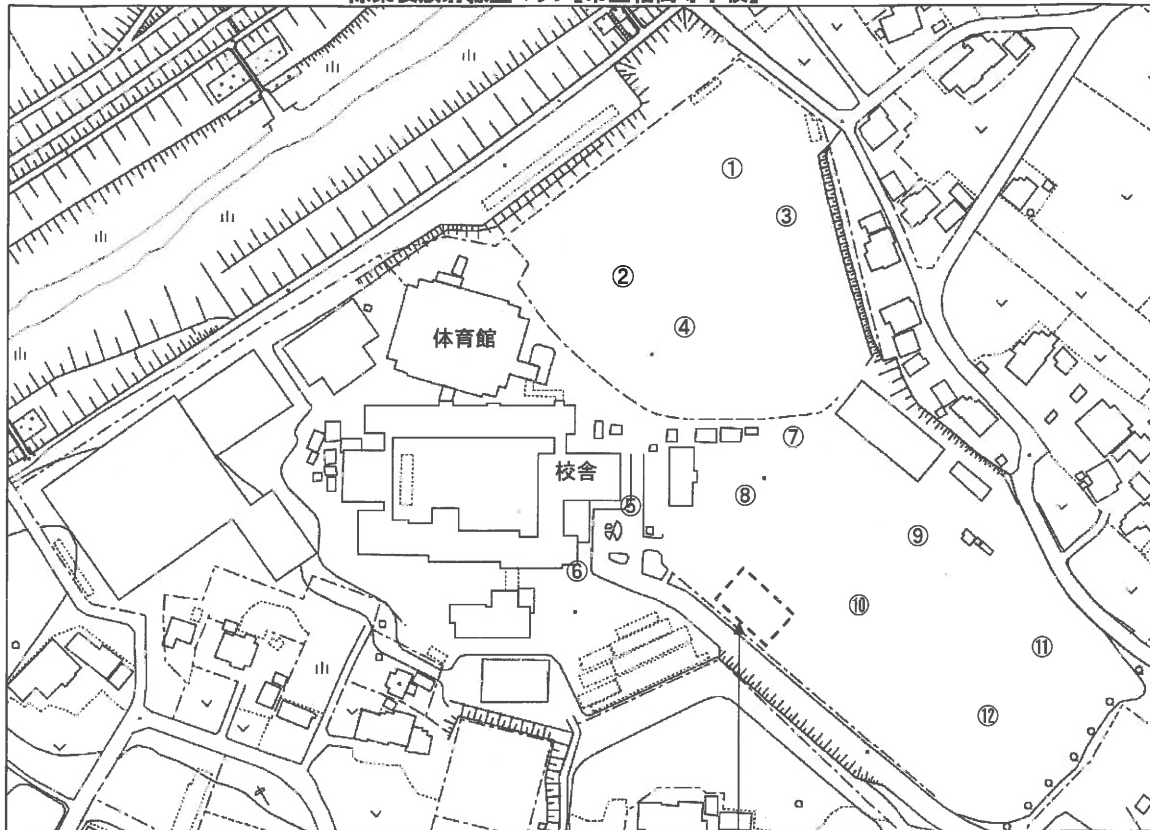

除去土壌
埋設箇所

○除染前測定日:平成24年12月11日

○除染後測定日:平成25年2月26日

(単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準		※2柏市目標			
			100cm		50cm		5cm	
			除染前	除染後	除染前	除染後	除染前	除染後
①	野球場	土	0.188	0.138	0.164	0.114	0.136	0.145
②	野球場	土	0.153	0.125	0.140	0.105	0.150	0.138
③	野球場	土	0.127	0.123	0.137	0.125	0.136	0.135
④	野球場	土	0.124	0.160	0.131	0.168	0.152	0.197
⑤	通路	舗装	0.130	0.116	0.147	0.106	0.152	0.105
⑥	通路	舗装	0.109	0.107	0.118	0.113	0.114	0.125
⑦	グラウンド	土	0.184	0.104	0.146	0.106	0.110	0.097
⑧	グラウンド	土	0.191	0.137	0.203	0.137	0.207	0.130
⑨	グラウンド	土	0.139	0.084	0.136	0.119	0.126	0.084
⑩	グラウンド	土	0.117	0.105	0.102	0.096	0.112	0.102
⑪	グラウンド	土	0.239	0.148	0.231	0.127	0.283	0.167
⑫	グラウンド	土	0.172	0.112	0.148	0.137	0.133	0.123
平均			0.156	0.122	0.150	0.121	0.151	0.129

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満
