


柏市青少年センターの敷地
(グラウンド・駐車場・キャンプ場等)

柏市青少年センター空間線量測定結果

施工前測定日: H24年4月5日(木)
施工後測定日: H24年5月31日(木)
H24年11月8日(木)

マイクロシーベルト/毎時

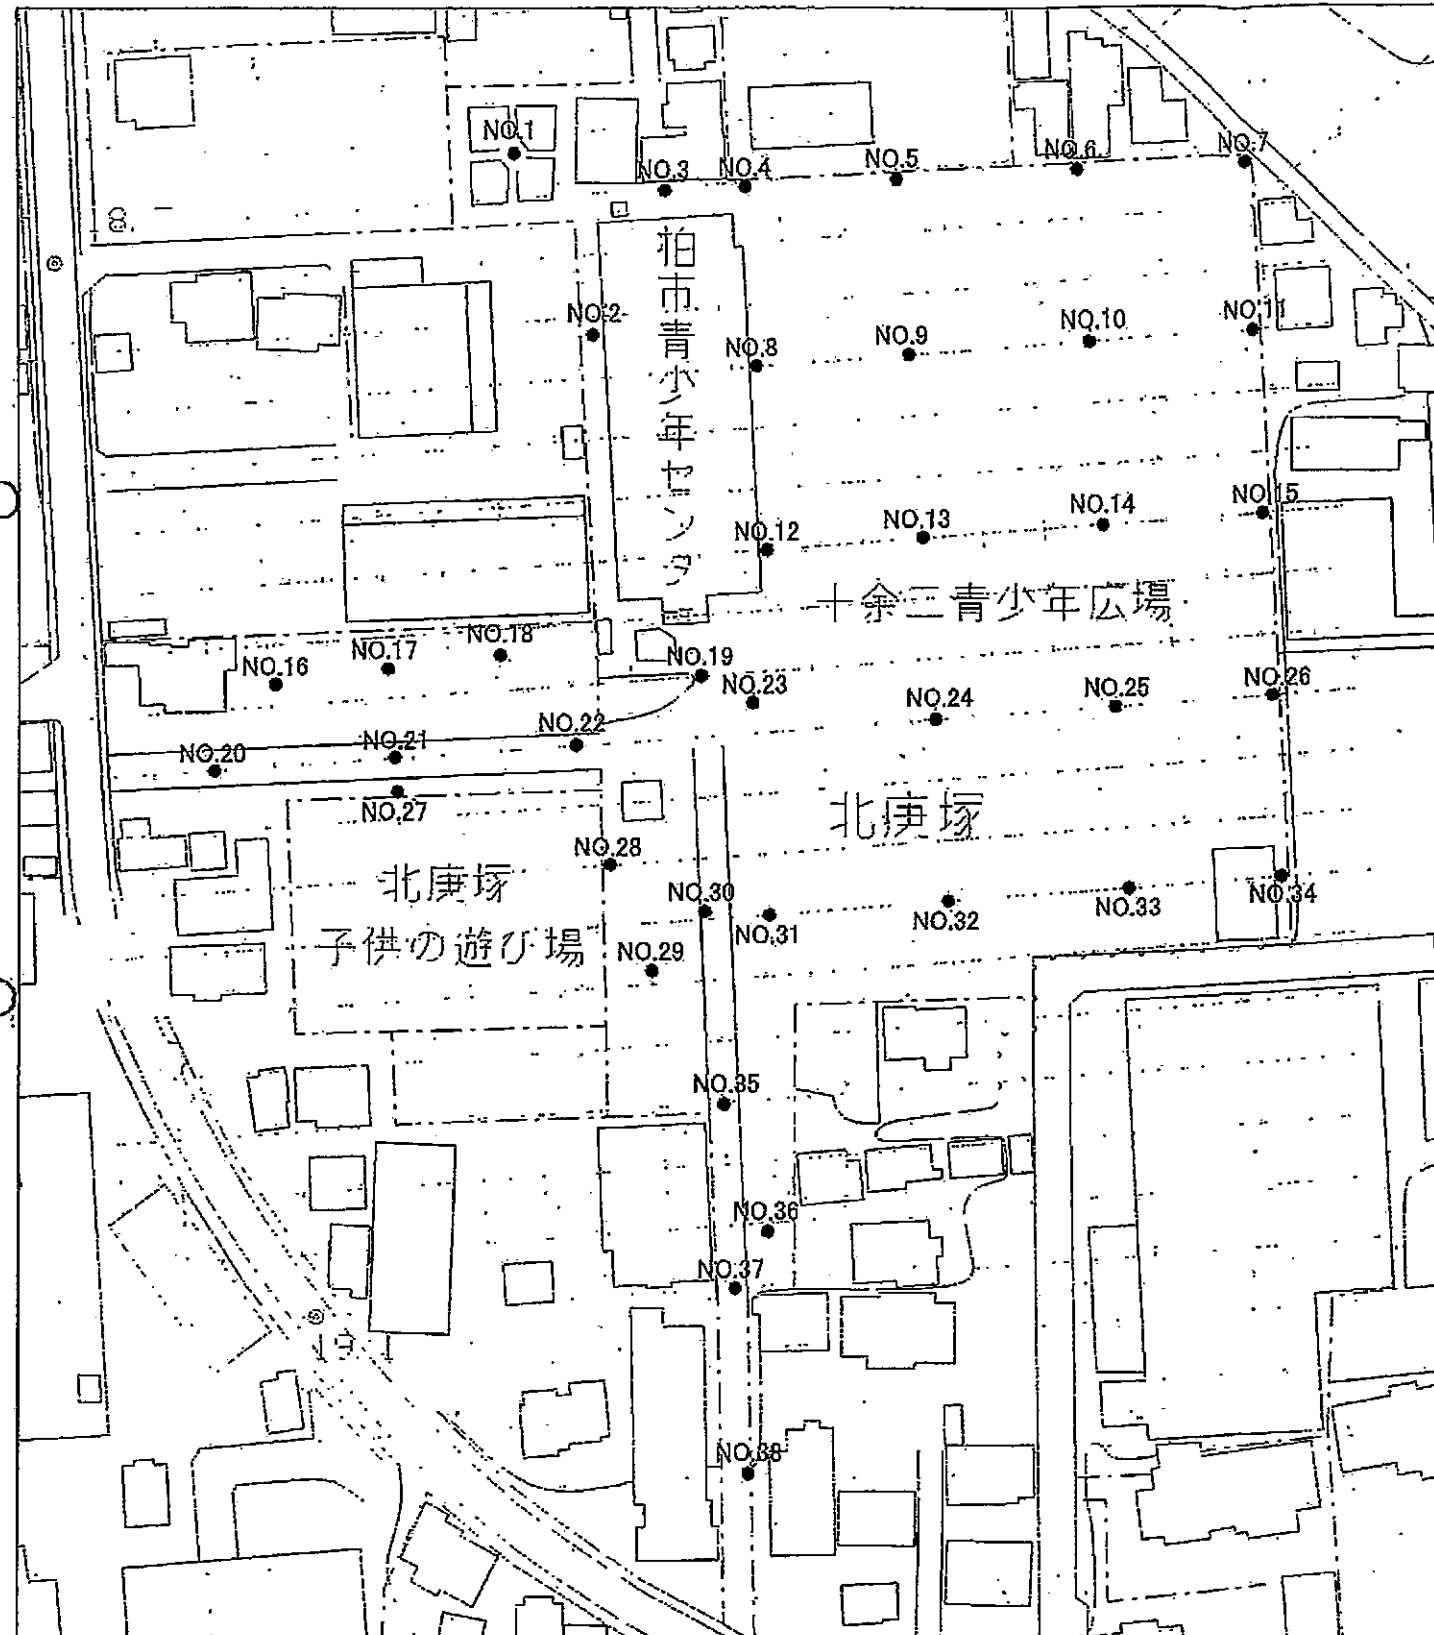

測定箇所	空間線量測定値						備考
	100cm		50cm		5cm		
	施工前	施工後	施工前	施工後	施工前	施工後	
NO.1	0.283	0.086	0.319	0.098	0.321	0.084	
NO.2	0.269	0.096	0.322	0.086	0.458	0.076	
NO.3	0.280	0.223	0.315	0.148	0.419	0.072	
NO.4	0.384	0.158	0.469	0.169	0.611	0.143	
NO.5	0.377	0.079	0.464	0.086	0.528	0.099	
NO.6	0.397	0.112	0.418	0.120	0.517	0.109	
NO.7	0.341	0.140	0.329	0.142	0.314	0.143	
NO.8	0.369	0.098	0.432	0.080	0.582	0.089	
NO.9	0.433	0.105	0.514	0.104	0.506	0.107	
NO.10	0.422	0.073	0.490	0.065	0.534	0.065	
NO.11	0.352	0.137	0.388	0.134	0.423	0.129	
NO.12	0.424	0.101	0.502	0.111	0.610	0.112	
NO.13	0.424	0.081	0.443	0.076	0.469	0.088	
NO.14	0.385	0.071	0.432	0.072	0.485	0.068	
NO.15	0.430	0.114	0.495	0.116	0.521	0.101	
NO.16	0.491	0.213	0.569	0.218	0.738	0.212	
NO.17	0.294	0.127	0.308	0.124	0.284	0.104	
NO.18	0.250	0.209	0.278	0.228	0.304	0.218	
NO.19	0.193	0.131	0.218	0.099	0.251	0.118	
NO.20	0.221	0.179	0.245	0.202	0.255	0.203	
NO.21	0.358	0.142	0.418	0.154	0.565	0.175	
NO.22	0.275	0.206	0.297	0.213	0.280	0.203	
NO.23	0.273	0.119	0.287	0.110	0.204	0.105	
NO.24	0.359	0.136	0.403	0.137	0.460	0.116	
NO.25	0.404	0.138	0.459	0.158	0.492	0.205	
NO.26	0.327	0.138	0.360	0.123	0.403	0.108	
NO.27	0.262	0.199	0.297	0.178	0.290	0.143	
NO.28	0.310	0.208	0.361	0.214	0.419	0.219	
NO.29	0.361	0.090	0.370	0.089	0.356	0.080	
NO.30	0.269	0.125	0.271	0.128	0.279	0.106	
NO.31	0.366	0.108	0.393	0.105	0.435	0.103	
NO.32	0.409	0.117	0.458	0.117	0.489	0.130	
NO.33	0.327	0.105	0.371	0.109	0.419	0.095	
NO.34	0.271	0.101	0.321	0.103	0.340	0.092	
NO.35	0.260	0.152	0.264	0.154	0.261	0.160	
NO.36	0.268	0.132	0.315	0.123	0.357	0.143	
NO.37	0.206	0.161	0.248	0.188	0.279	0.223	
NO.38	0.186	0.167	0.220	0.186	0.258	0.191	
