



9年間の義務教育をつなぐ

柏中学校区義務教育学校

義務教育学校の開校が**令和12年4月**に**延期**となります

柏市教育委員会では、これまで義務教育学校の設置に向けて、令和10年度の開校を目指して取り組んでまいりましたが、建設業における働き方改革の一環として進められている時間外労働規制や公共工事における週休二日制の推進の影響などにより、開校までのスケジュールを見直し、「**令和12年4月開校**」を目指して事業を進めていくことといたしました。


当初予定より開校を2年後ろ倒しにする主な理由は以下のとおりです。

- 新校舎と既存校舎を近接させ、小・中学校間の連携を高めたより良い教育環境を整備するため、また、現在の柏中学校の運営への影響を最小限に留めるため、新校舎建設前に仮設グラウンドの工事を先行して実施します。このことにより、**新校舎の工事着手が約1年延期となります**
- 建設業における働き方改革の一環として進められている時間外労働の規制や、公共工事における週休二日制の推進等の影響により、**工事期間が約1年延長となります**(約2年間と想定していた工事期間が約3年間へ)

令和10年の開校を楽しみにしていた皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、開校までの間、地域協議会での意見交換や出前講座型意見交換会の実施など、これまで以上に丁寧な意見聴取と情報発信に努めてまいります。

子どもたちや保護者、地域の方々が安心して開校を迎えられるよう進めてまいりますので、引き続き、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【開校までのスケジュール】

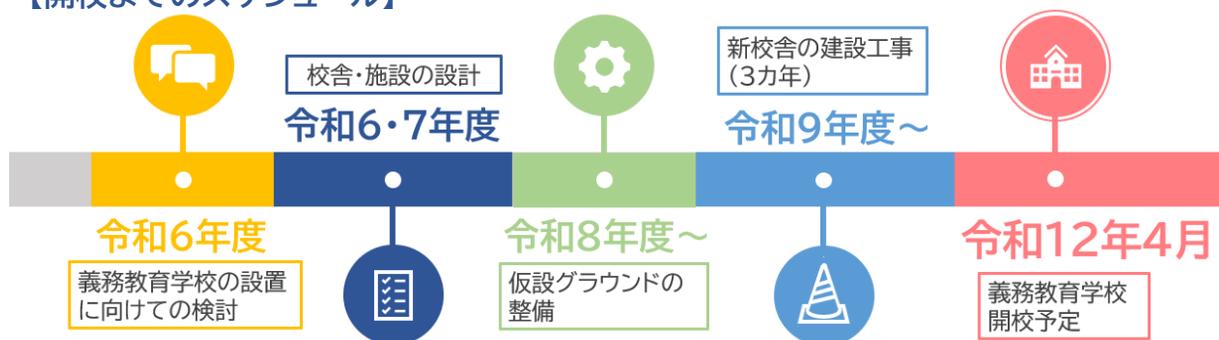

【現在の年齢(学年)と開校時の学年】

現在の年齢 (R6.4月現在)	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	現在の学年 (R6.4月現在)	小1	小2	小3	小4~
開校時の学年	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生	開校時の学年	7年生 (中1)	8年生 (中2)	9年生 (中3)	-

説明動画
FAQ



柏市 HP

問い合わせ
メール



問い合わせメール

出前講座型
意見交換会



申請フォーム

柏市教育委員会 教育総務部 教育政策課

04-7197-2630

kyoikuseisaku@city.kashiwa.chiba.jp

